

Ofício nº 1005/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 02 de agosto de 2023.

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA**

Vossa Senhoria  
**NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO**  
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **2º ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF EM PITORO DA PONTE**, na localidade de Pitoro da Ponte no Polo de Curupaiti, no Município de Viseu, contrato nº 393/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022.


A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 2º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 19/08/2023 a 15/02/2024. E assim sendo, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com 75,04% de execução físico-financeiro.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 2882023 – SEMOB.
- Ofício Sec. Educação nº 971/2023 - SEMED
- Justificativa Técnica.
- Solicitação de Aditivo de Prazo.
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,



**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 004/2023



Ofício N.º 0288 / 2023 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 2 de agosto de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

**CEMED**  
SECRETARIA DE PROTOCOLO  
**RECEBIDO**

Para: **Secretaria Municipal de Educação**  
Ângela Lima da Silva

EM 02/08/23  
ÀS 13h31  
RESP: [Assinatura]

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE 2º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. PITORO DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORO DA PONTE (POLO CURUPAITI) COM 166,17 m<sup>2</sup>, NO MUNICÍPIO DE VISEU - PA - TOMADA DE PREÇO 021/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.<sup>a</sup> para análise o 2º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. E. F. PITORO DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORO DA PONTE (POLO CURUPAITI) COM 166,17 m<sup>2</sup>, NO MUNICÍPIO DE VISEU - PA, Contrato Administrativo N° 393/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 021/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **2º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **19/08/2023** a **15/02/2024**.

A obra encontra-se com **75,04%** de execução físico-financeira. Conforme a justificativa técnica da engenharia em anexo.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Ofício N° 971/2023-GS/SEMED/PMV – SOLICITANDO ANÁLISE TÉCNICA;
- Solicitação de Aditivo da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Relatório de Desempenho;
- Relatório Fotográfico e
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO  
PINTO  
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por  
CARLOS AUGUSTO PINTO  
CORREA:00433788208  
Dados: 2023.08.02 10:41:51  
-03'00'

**Carlos Augusto Pinto Corrêa**  
Secretário de Obras e Infraestrutura/Engenheiro Civil  
Decreto n° 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2  
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Ofício nº 971/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 25 de julho de 2023.

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Vossa Senhoria  
**CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA**  
Secretário Municipal de Obras


SECRETARIA MUN. DE OBRAS  
RECEBIDO ÀS 16 / 24 h  
Em: 25 / 07 / 2023

Assinatura / Visto

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, em anexo, para Análise Técnica referente **2º ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 393/2022, Tomada de Preço nº 021/2022 da EMEF EM PITIRO DA PONTE, POLO CURUPAITI, no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,



**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 04/2023

### JUSTIFICATIVA TÉCNICA

**Assunto:** ADITIVO DE PRAZO

**Contrato:** Nº 393/2022/CPL - TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022

**Contratada:** ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ:** 32.007.827/0001-13

**Objeto:** CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI) COM 166,17 m<sup>2</sup> – NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: Nº 393/2022/CPL** que provocaram o atraso na execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI) COM 166,17 m<sup>2</sup> – NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois em razão de contratemplos oriundos das chuvas decorrentes do período do inverno regional, os quais influenciaram na execução regular dos serviços e no acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na mobilização de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB**, para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento da obra, que se encontra com percentual de 75,04% executada.


Assim apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Em consulta à contratada, este manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor;
- b) A continuidade na execução do objeto já contratado minimiza custos e tempo, já que seria mais oneroso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;

- c) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento (**19/08/2023 a 15/02/2024**) do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 01 de Agosto de 2023.



**Simão Pedro Quadros Teixeira**

Engenheiro Civil - PMV

Crea-PA: 1521489947

Prefeitura Municipal de Viseu-PA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI)  
COM 166,17 M<sup>2</sup> - NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

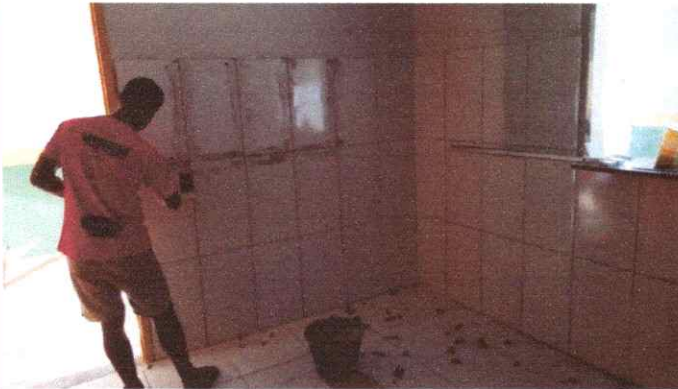


Imagem 01: Preenchimento de juntas de assentamento entre placas cerâmicas.



Imagem 02: Limpeza de preenchimento de juntas de assentamento entre placas cerâmicas.



Imagem 03: Limpeza de preenchimento de juntas de assentamento entre placas cerâmicas.



Imagem 04: Cerâmica assentada aguardando preenchimento de juntas.



Imagem 05: Limpeza da obra.



Imagem 05: Fachada do prédio escolar.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Local: Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti), MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: TP Nº 021/2022/CPL	O. S. em: 08/12/2022	Identificação da contratada:	Emissão: 04/07/2023	MEDICÃO:
Obra: Construção da E.M.E.F. Pitoró da Ponte, Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti) com 166,17 M², no Município de Viseu-PA	Contrato nº.: 393/2022/CPL	Prazo: Junho		Mês: Junho	02
EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Assinatura: 21/10/2022	Término: Valor do contrato R\$ 336.880,40		Período: 24/01/2023 à 27/06/2023	
CNPJ: 32.007.827/0001-13					

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.429,60										
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	R\$ 221,02	R\$ 1.326,12	6,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 1.326,12	6,00	100,00%	R\$ 1.326,12	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	10	R\$ 364,84	R\$ 3.648,40	10,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 3.648,40	10,00	100,00%	R\$ 3.648,40	0,00	R\$ -
1.3	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontilhaladas A Cada 2,00M - 2 Utilizações. Al_10/2018	M	134,08	R\$ 63,06	R\$ 8.455,08	134,08	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 8.455,08	134,08	100,00%	R\$ 8.455,08	0,00	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 1.580,73										
2.1	EDIFICAÇÃO				R\$ 1.580,73										
2.1.1	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	14,91	R\$ 65,73	R\$ 980,03	14,91	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 980,03	14,91	100,00%	R\$ 980,03	0,00	R\$ -
2.1.2	Relevo compactado	m³	8,31	R\$ 69,88	R\$ 580,70	8,31	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 580,70	8,31	100,00%	R\$ 580,70	0,00	R\$ -
3	FUNDAÇÕES				R\$ 19.806,22										
3.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS				R\$ 9.730,78										
3.1.1	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m²	2,59	R\$ 3.757,06	R\$ 9.730,78	2,59	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 9.730,78	2,59	100,00%	R\$ 9.730,78	0,00	R\$ -
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES				R\$ 10.075,44										
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cimbra de amarração	m²	2,9	R\$ 3.474,28	R\$ 10.075,44	2,90	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 10.075,44	2,90	100,00%	R\$ 10.075,44	0,00	R\$ -
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 16.230,15										
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 5.451,66										
4.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	1,31	R\$ 4.161,58	R\$ 5.451,66	1,31	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 5.451,66	1,31	100,00%	R\$ 5.451,66	0,00	R\$ -
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 10.778,49										
4.2.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	2,59	R\$ 4.161,58	R\$ 10.778,49	2,59	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 10.778,49	2,59	100,00%	R\$ 10.778,49	0,00	R\$ -
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 24.726,00										
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 24.452,42										
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a queijado	m²	282,1	R\$ 86,68	R\$ 24.452,42	282,10	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 24.452,42	282,10	100,00%	R\$ 24.452,42	0,00	R\$ -
5.2	ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)				R\$ 273,58										
5.2.1	Alvenaria tijolo de barro a queijado	m²	2,33	R\$ 117,42	R\$ 273,58	2,33	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 273,58	2,33	100,00%	R\$ 273,58	0,00	R\$ -
6	ESQUADRIAS				R\$ 17.306,30										
6.1	PORTAS				R\$ 3.491,12										
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho	m²	8,4	R\$ 415,61	R\$ 3.491,12	8,40	100,00%	4,20	50,00%	R\$ 1.745,56	4,20	50,00%	R\$ 1.745,56	4,20	R\$ 1.745,56
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 1.552,45										
6.2.1	Barra em aço inox (PCD)	M	4,4	R\$ 352,83	R\$ 1.552,45	4,40	100,00%	4,40	100,00%	R\$ 1.552,45	4,40	100,00%	R\$ 1.552,45	0,00	R\$ -
6.3	JANELAS				R\$ 12.083,73										
6.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,48	R\$ 810,45	R\$ 389,01	0,48	100,00%	0,48	100,00%	R\$ 389,01	0,48	100,00%	R\$ 389,01	0,00	R\$ -
6.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	12,8	R\$ 913,65	R\$ 11.694,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	12,80	R\$ 11.694,72
6.4	VIDROS				R\$ 179,00										
6.4.1	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	UN	0,8	R\$ 223,76	R\$ 179,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,80	R\$ 179,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 45.985,53										
7.1	Tecura em mad. de lei p/ vão de 6,0m	UN	2	R\$ 1.810,34	R\$ 3.620,68	2,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 3.620,68	2,00	100,00%	R\$ 3.620,68	0,00	R\$ -
7.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada	m²	181,47	R\$ 119,58	R\$ 21.700,18	181,47	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 21.700,18	181,47	100,00%	R\$ 21.700,18	0,00	R\$ -
7.3	Imunização para madeira	m²	181,47	R\$ 7,68	R\$ 1.393,68	181,47	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 1.393,68	181,47	100,00%	R\$ 1.393,68	0,00	R\$ -
7.4	Cobertura - telha plan	m²	181,47	R\$ 103,84	R\$ 18.843,84	181,47	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 18.843,84	181,47	100,00%	R\$ 18.843,84	0,00	R\$ -
7.5	Cumeiteira de barro	M	18,2	R\$ 23,47	R\$ 427,15	18,20	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 427,15	18,20	100,00%	R\$ 427,15	0,00	R\$ -
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 4.717,90										
8.1	Impermeabilização para baldrame	m²	54,31	R\$ 86,87	R\$ 4.717,90	54,31	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 4.717,90	54,31	100,00%	R\$ 4.717,90	0,00	R\$ -
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 35.383,02										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

O.S. em:	08/12/2022	Identificação da contratada:	Emissão:	04/07/2023	MEDICÃO:
Prazo:	393/2022/CPL	Modalidade:	Mês:	Junho	
Término:	21/10/2022	Contrato nº:	Período:	24/01/2023 à 27/06/2023	02
Assinatura:	ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Valor do contrato			
CPF:	32.007.827/0001-13	R\$ 338.880,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
3.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	385,81	R\$ 13,91	R\$ 5.088,41	73,16	20,00%	R\$ 1.017,68	292,65	80,00%	R\$ 4.070,76	365,81	100,00%	R\$ 5.088,43	0,00	R\$ 0,00
3.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	316,48	R\$ 56,86	R\$ 17.985,05	30,90	9,76%	R\$ 1.756,77	285,58	90,24%	R\$ 16.238,08	316,48	100,00%	R\$ 17.984,85	0,00	R\$ 0,00
3.3	Revestimento Cerâmico Pedrado Médio	m²	49,33	R\$ 104,19	R\$ 5.139,68	0,00	0,00%	-	49,33	100,00%	R\$ 5.139,68	49,33	100,00%	R\$ 5.139,68	0,00	R\$ 0,00
3.4	Forno em lambril de PVC	m²	134,08	R\$ 53,40	R\$ 7.159,87	0,00	0,00%	-	134,08	100,00%	R\$ 7.159,87	134,08	100,00%	R\$ 7.159,87	0,00	R\$ 0,00
10	SISTEMAS DE PISOS				R\$ 33.906,21											
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 33.906,21											
10.1.1	Concreto simples c/ seio e=5cm traço 1:2:3	m²	166,17	R\$ 85,95	R\$ 14.282,31	0,00	0,00%	-	166,17	100,00%	R\$ 14.282,31	166,17	100,00%	R\$ 14.282,31	0,00	R\$ 0,00
10.1.2	Lajota cerâmica - (Pedrado Médio)	m²	128,28	R\$ 115,10	R\$ 14.765,02	0,00	0,00%	-	128,28	100,00%	R\$ 14.765,02	128,28	100,00%	R\$ 14.765,02	0,00	R\$ 0,00
10.1.3	Soleira e pelotim - granito preto - e=2cm	m²	0,68	R\$ 657,05	R\$ 446,79	0,00	0,00%	-	0,68	100,00%	R\$ 446,79	0,68	100,00%	R\$ 446,79	0,00	R\$ 0,00
10.1.4	Execução De Passelo (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado, AL_08/2022	m²	37,96	R\$ 116,23	R\$ 4.412,09	0,00	0,00%	-	37,96	100,00%	R\$ 4.412,09	37,96	100,00%	R\$ 4.412,09	0,00	R\$ 0,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 19.792,11											
11.1	Esmalte s/ parede c/ massa e selador	m²	316,48	R\$ 46,82	R\$ 14.817,59	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	316,48	R\$ 14.817,59
11.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	16,8	R\$ 51,55	R\$ 866,04	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16,80	R\$ 866,04
11.3	Pintura s/ telha cerâmica	m²	181,47	R\$ 22,84	R\$ 4.108,48	181,47	100,00%	R\$ 4.108,48	0,00	0,00%	R\$ -	181,47	100,00%	R\$ 4.108,48	0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 6.589,96											
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 1.395,09											
12.1.1	Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	25	R\$ 15,24	R\$ 381,00	0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	R\$ 381,00	25,00	100,00%	R\$ 381,00	0,00	R\$ 0,00
12.1.2	Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	15	R\$ 17,93	R\$ 268,95	0,00	0,00%	-	15,00	100,00%	R\$ 268,95	15,00	100,00%	R\$ 268,95	0,00	R\$ 0,00
12.1.3	Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH	M	10	R\$ 40,80	R\$ 408,00	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	R\$ 408,00	10,00	100,00%	R\$ 408,00	0,00	R\$ 0,00
12.1.4	Joelho/Colovelo 45° PVC JS - 20mm (LH)	UN	1	R\$ 11,55	R\$ 11,55	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	R\$ 11,55	1,00	100,00%	R\$ 11,55	0,00	R\$ 0,00
12.1.5	Joelho/Colovelo 90° PVC - JS - 20mm-LH	UN	8	R\$ 10,39	R\$ 83,12	0,00	0,00%	-	8,00	100,00%	R\$ 83,12	8,00	100,00%	R\$ 83,12	0,00	R\$ 0,00
12.1.6	Joelho/Colovelo 90° PVC - JS - 25mm-LH	UN	3	R\$ 11,16	R\$ 33,48	0,00	0,00%	-	3,00	100,00%	R\$ 33,48	3,00	100,00%	R\$ 33,48	0,00	R\$ 0,00
12.1.7	Joelho/Colovelo 90° PVC - JS - 40mm-LH	UN	7	R\$ 22,51	R\$ 157,57	0,00	0,00%	-	7,00	100,00%	R\$ 157,57	7,00	100,00%	R\$ 157,57	0,00	R\$ 0,00
12.1.8	Tê em PVC - JS - 20mm-LH	UN	3	R\$ 9,90	R\$ 29,70	0,00	0,00%	-	3,00	100,00%	R\$ 29,70	3,00	100,00%	R\$ 29,70	0,00	R\$ 0,00
12.1.9	Tê em PVC - JS - 25mm-LH	UN	2	R\$ 10,86	R\$ 21,72	0,00	0,00%	-	2,00	100,00%	R\$ 21,72	2,00	100,00%	R\$ 21,72	0,00	R\$ 0,00
12.2	REGISTROS E OUTROS				R\$ 5.194,87											
12.2.1	Registro de gaveta c/ canopia - 3/4"	UN	1	R\$ 156,06	R\$ 156,06	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	R\$ 156,06	1,00	100,00%	R\$ 156,06	0,00	R\$ 0,00
12.2.2	Registro de gaveta c/ canopia - 1"	UN	1	R\$ 191,10	R\$ 191,10	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	R\$ 191,10	1,00	100,00%	R\$ 191,10	0,00	R\$ 0,00
12.2.3	Registro de gaveta c/ canopia - 1 1/2"	UN	3	R\$ 306,27	R\$ 918,81	0,00	0,00%	-	3,00	100,00%	R\$ 918,81	3,00	100,00%	R\$ 918,81	0,00	R\$ 0,00
12.2.4	Torneira de bota 3/4"	UN	1	R\$ 65,66	R\$ 65,66	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	R\$ 65,66	1,00	100,00%	R\$ 65,66	0,00	R\$ 0,00
12.2.5	Reservatório em polietileno de 1.500 L	UN	1	R\$ 3.863,24	R\$ 3.863,24	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	R\$ 3.863,24	1,00	100,00%	R\$ 3.863,24	0,00	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 14.194,24											
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$ 1.119,61											
13.1.1	Tubo em PVC - 40mm (LS)	M	7,5	R\$ 20,42	R\$ 153,15	7,50	100,00%	R\$ 153,15	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 153,15	0,00	R\$ 0,00
13.1.2	Tubo em PVC - 50mm (LS)	M	7,5	R\$ 27,16	R\$ 203,70	7,50	100,00%	R\$ 203,70	0,00	0,00%	R\$ -	7,50	100,00%	R\$ 203,70	0,00	R\$ 0,00
13.1.3	Tubo em PVC - 100mm (LS)	M	5	R\$ 46,71	R\$ 233,55	5,00	100,00%	R\$ 233,55	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 233,55	0,00	R\$ 0,00
13.1.4	Joelho/Colovelo 45° PVC JS - 40mm - LS	UN	5	R\$ 19,64	R\$ 98,20	5,00	100,00%	R\$ 98,20	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 98,20	0,00	R\$ 0,00
13.1.5	Joelho/Colovelo 45° PVC JS - 50mm - LS	UN	2	R\$ 22,47	R\$ 44,94	2,00	100,00%	R\$ 44,94	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 44,94	0,00	R\$ 0,00
13.1.6	Joelho/Colovelo 90° RC em PVC - JS - 40mm-LS	UN	3	R\$ 18,01	R\$ 54,03	3,00	100,00%	R\$ 54,03	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 54,03	0,00	R\$ 0,00
13.1.7	Joelho/Colovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	UN	3	R\$ 20,59	R\$ 61,77	3,00	100,00%	R\$ 61,77	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 61,77	0,00	R\$ 0,00
13.1.8	Joelho/Colovelo 90° RC em PVC - JS - 100mm-LS	UN	2	R\$ 31,78	R\$ 63,56	2,00	100,00%	R\$ 63,56	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 63,56	0,00	R\$ 0,00
13.1.9	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	UN	2	R\$ 65,24	R\$ 130,48	2,00	100,00%	R\$ 130,48	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 130,48	0,00	R\$ 0,00
13.1.10	Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS	UN	1	R\$ 21,13	R\$ 21,13	1,00	100,00%	R\$ 21,13	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 21,13	0,00	R\$ 0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Identificação da contratada:  
**ALX**

Emissão: 04/07/2023  
Mês: Junho  
Período: 24/01/2023 a 27/06/2023  
MEDIÇÃO: **02**

O. S. em: 08/12/2022  
Prazo: 393/2022/CPL  
Término: 21/10/2022  
Valor do contrato: R\$ 336.880,40

Modalidade: TP Nº 021/2022/CPL  
Contrato nº: 393/2022/CPL  
Assinatura: 21/10/2022


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
13.1.11	Tê outro em PVC - JS - 50x50mm-LS	UN	2	R\$ 27,55	R\$ 55,10	2,00	100,00%	0,00	0,00%	55,10	2,00	100,00%	55,10	0,00	R\$ -
13.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS				R\$ 13.074,63										
13.2.1	Caixa sinalizada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	UN	1	R\$ 38,15	R\$ 38,15	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 38,15	1,00	100,00%	R\$ 38,15	0,00	R\$ -
13.2.2	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto	UN	1	R\$ 1.246,24	R\$ 1.246,24	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 1.246,24	1,00	100,00%	R\$ 1.246,24	0,00	R\$ -
13.2.3	Caixa em alvenaria de 80x80x60cm c/ tpo. concreto	UN	1	R\$ 1.092,76	R\$ 1.092,76	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 1.092,76	1,00	100,00%	R\$ 1.092,76	0,00	R\$ -
13.2.4	Relo PVC c/ saída 100x53x40mm	UN	2	R\$ 14,01	R\$ 28,02	2,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 28,02	2,00	100,00%	R\$ 28,02	0,00	R\$ -
13.2.5	Sumidouro em alvenaria c/ tpo em concreto - cap= 30 pessoas	UN	1	R\$ 3.297,62	R\$ 3.297,62	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 3.297,62	1,00	100,00%	R\$ 3.297,62	0,00	R\$ -
13.2.6	Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas	UN	1	R\$ 7.371,84	R\$ 7.371,84	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 7.371,84	1,00	100,00%	R\$ 7.371,84	0,00	R\$ -
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 4.204,81										
14.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	2	R\$ 731,47	R\$ 1.462,94	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 1.462,94	2,00	100,00%	R\$ 1.462,94	0,00	R\$ -
14.2	Cuba em aço inox 40 x30 x15cm	UN	1	R\$ 277,07	R\$ 277,07	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 277,07	1,00	100,00%	R\$ 277,07	0,00	R\$ -
14.3	Lavatório de louça sica crom., sifão e valv.	UN	2	R\$ 646,95	R\$ 1.293,90	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 1.293,90	2,00	100,00%	R\$ 1.293,90	0,00	R\$ -
14.4	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula	UN	1	R\$ 762,73	R\$ 762,73	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 762,73	1,00	100,00%	R\$ 762,73	0,00	R\$ -
14.5	Torneira plástica de 1/2"	UN	1	R\$ 56,21	R\$ 56,21	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 56,21	1,00	100,00%	R\$ 56,21	0,00	R\$ -
14.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	2	R\$ 93,56	R\$ 187,12	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 187,12	2,00	100,00%	R\$ 187,12	0,00	R\$ -
14.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	UN	2	R\$ 82,42	R\$ 164,84	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 164,84	2,00	100,00%	R\$ 164,84	0,00	R\$ -
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 281,17										
15.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	UN	1	R\$ 281,17	R\$ 281,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 281,17
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V				R\$ 15.264,30										
16.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 1.481,62										
16.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1	R\$ 497,03	R\$ 497,03	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 497,03	1,00	100,00%	R\$ 497,03	0,00	R\$ -
16.1.2	Quadro de distribuição bifásico (c/ disjuntor)	UN	1	R\$ 734,15	R\$ 734,15	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 734,15	1,00	100,00%	R\$ 734,15	0,00	R\$ -
16.1.3	Disjuntor IP - 6 e 32A - PADRÃO DIN	UN	2	R\$ 28,46	R\$ 56,92	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 56,92	2,00	100,00%	R\$ 56,92	0,00	R\$ -
16.1.4	Disjuntor IP - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	1	R\$ 48,38	R\$ 48,38	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 48,38	1,00	100,00%	R\$ 48,38	0,00	R\$ -
16.1.5	Disjuntor IP - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	1	R\$ 48,38	R\$ 48,38	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 48,38	1,00	100,00%	R\$ 48,38	0,00	R\$ -
16.1.6	Disjuntor IP - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	1	R\$ 48,38	R\$ 48,38	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 48,38	1,00	100,00%	R\$ 48,38	0,00	R\$ -
16.1.7	Disjuntor IP - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	1	R\$ 48,38	R\$ 48,38	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 48,38	1,00	100,00%	R\$ 48,38	0,00	R\$ -
16.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 8.861,28										
16.2.1	Eletroduto PVC Rígido de 1"	M	55	R\$ 15,15	R\$ 833,25	55,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 833,25	55,00	100,00%	R\$ 833,25	0,00	R\$ -
16.2.2	Eletroduto PVC Rígido de 2"	M	20	R\$ 36,13	R\$ 722,60	20,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 722,60	20,00	100,00%	R\$ 722,60	0,00	R\$ -
16.2.3	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	UN	2	R\$ 237,25	R\$ 474,50	2,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 474,50	2,00	100,00%	R\$ 474,50	0,00	R\$ -
16.2.4	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	UN	1	R\$ 674,90	R\$ 674,90	1,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 674,90	1,00	100,00%	R\$ 674,90	0,00	R\$ -
16.2.5	Caixa plástica 4x4"	UN	1	R\$ 4,41	R\$ 4,41	0,00	0,00%	1,00	100,00%	R\$ 4,41	1,00	100,00%	R\$ 4,41	0,00	R\$ -
16.2.6	Caixa plástica octogonal	UN	12	R\$ 6,91	R\$ 82,92	0,00	0,00%	12,00	100,00%	R\$ 82,92	12,00	100,00%	R\$ 82,92	0,00	R\$ -
16.2.7	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	UN	1	R\$ 6.068,70	R\$ 6.068,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 6.068,70
16.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 1.588,73										
16.3.1	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	55,33	R\$ 9,11	R\$ 504,05	55,33	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 504,05	55,33	100,00%	R\$ 504,05	0,00	R\$ -
16.3.2	Cabo de cobre 4mm2 - 750 V	M	10,55	R\$ 11,92	R\$ 125,75	10,55	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 125,75	10,55	100,00%	R\$ 125,75	0,00	R\$ -
16.3.3	Cabo de cobre 6mm2 - 750 V	M	14,12	R\$ 15,02	R\$ 212,08	14,12	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 212,08	14,12	100,00%	R\$ 212,08	0,00	R\$ -
16.3.4	Cabo de cobre 10mm2 - 750 V	M	35,48	R\$ 21,05	R\$ 746,85	35,48	100,00%	0,00	0,00%	R\$ 746,85	35,48	100,00%	R\$ 746,85	0,00	R\$ -
16.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES				R\$ 3.332,67										
16.4.1	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	UN	15	R\$ 36,11	R\$ 541,65	0,00	0,00%	15,00	100,00%	R\$ 541,65	15,00	100,00%	R\$ 541,65	0,00	R\$ -
16.4.2	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/ fiação)	UN	2	R\$ 42,44	R\$ 84,88	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 84,88	2,00	100,00%	R\$ 84,88	0,00	R\$ -
16.4.3	Tomada 2P+T 20A (s/ fiação)	UN	2	R\$ 31,48	R\$ 62,96	0,00	0,00%	2,00	100,00%	R\$ 62,96	2,00	100,00%	R\$ 62,96	0,00	R\$ -





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

O. S. em: 08/12/2022 Identificação da contratada:  Emissão: 04/07/2023 **MEDIÇÃO: 02**

Modalidade: TP Nº 021/2022/CPL Prazo: Junho Mês: Junho

Contrato nº: 393/2022/CPL Assinatura: Valor do contrato 24/01/2023 a 27/06/2023 Período: 24/01/2023 a 27/06/2023

Assinatura: Valor do contrato R\$ 336.880,40

ITEM	CONTRATO			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
16.4.4	UN	4	R\$ 20,08	R\$ 80,32	4,00	100,00%	R\$ 80,32	4,00	100,00%	R\$ 80,32	0,00	R\$ -
16.4.5	UN	1	R\$ 51,27	R\$ 51,27	1,00	100,00%	R\$ 51,27	1,00	100,00%	R\$ 51,27	0,00	R\$ -
16.4.6	UN	2	R\$ 52,42	R\$ 104,84	2,00	100,00%	R\$ 104,84	2,00	100,00%	R\$ 104,84	0,00	R\$ -
16.4.7	UN	15	R\$ 160,45	R\$ 2.406,75	15,00	100,00%	R\$ 2.406,75	15,00	100,00%	R\$ 2.406,75	0,00	R\$ -
<b>17 URBANIZAÇÃO:</b>				<b>R\$ 21.594,67</b>								
17.1	m²	150	R\$ 24,46	R\$ 3.669,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	150,00	R\$ 3.669,00
17.2	m²	33,8	R\$ 86,41	R\$ 2.903,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	33,80	R\$ 2.903,37
17.3	PLAYGROUND:			R\$ 15.022,30								
17.3.1	m²	51	R\$ 44,86	R\$ 2.287,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	51,00	R\$ 2.287,86
17.3.2	un	1	R\$ 1.680,61	R\$ 1.680,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1.680,61
17.3.3	un	1	R\$ 2.441,61	R\$ 2.441,61	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 2.441,61
17.3.4	un	1	R\$ 2.514,40	R\$ 2.514,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 2.514,40
17.3.5	un	1	R\$ 6.097,82	R\$ 6.097,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 6.097,82
<b>18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 7.419,91</b>								
18.1	UN	1	R\$ 1.230,89	R\$ 1.230,89	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1.230,89
18.1.1	CJ	1	R\$ 2.953,73	R\$ 2.953,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 2.953,73
18.1.2	m²	4,8	R\$ 574,02	R\$ 3.235,29	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,80	R\$ 3.235,29
18.1.3	m²	135,19	R\$ 8,75	R\$ 1.182,91	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	135,19	R\$ 1.182,91
18.1.4	UN	1	R\$ 991,17	R\$ 991,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 991,17
18.1.5	UN	1	R\$ 24.362,11	R\$ 24.362,11	1,00	100,00%	R\$ 24.362,11	1,00	100,00%	R\$ 24.362,11	0,00	R\$ -
18.1.6	UN	1	R\$ 4.255,24	R\$ 4.255,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 4.255,24
18.1.7	PT	4	R\$ 592,13	R\$ 2.368,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	R\$ 2.368,52
18.1.8	M	3	R\$ 442,54	R\$ 1.327,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 1.327,62
<b>19 SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 34.487,57</b>								
19.1	UN	1	R\$ 991,17	R\$ 991,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 991,17
19.2	UN	1	R\$ 24.362,11	R\$ 24.362,11	1,00	100,00%	R\$ 24.362,11	1,00	100,00%	R\$ 24.362,11	0,00	R\$ -
19.3	UN	1	R\$ 4.255,24	R\$ 4.255,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 4.255,24
19.4	PT	4	R\$ 592,13	R\$ 2.368,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	R\$ 2.368,52
19.5	M	3	R\$ 442,54	R\$ 1.327,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 1.327,62
19.6	M	3	R\$ 442,54	R\$ 1.327,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 1.327,62
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 150.200,40</b>			<b>R\$ 102.580,60</b>			<b>R\$ 252.781,00</b>		<b>R\$ 84.099,40</b>

Observações:

RESUMO DA OBRA		RESUMO CONTRATO	
DADOS OBRIGATORIOS NA NF		VALOR CONTRATO: R\$ 336.880,40	
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR ACUMULADO: R\$ 252.781,00	
EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		SALDO CONTRATO: R\$ 84.099,40	
CNPJ: 32.007.827/0001-13		% EXECUTADO: 75,04%	
LOCAL: Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti), MUNICIPIO DE VISEU-PA			
Contrato: 393/2022/CPL			
Valor: R\$ 102.580,60			
J.A. ME:			
ISS: R\$ 1.538,71 1,50%			

**MEDIÇÃO 02**

**VALOR NOTA FISCAL**

**R\$ 102.580,60**

**HISTORICO DAS MEDIÇÕES**

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 150.200,40	44,59%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 102.580,60	30,45%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 252.781,00</b>	<b>75,04%</b>

**EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 32.007.827/0001-13**  
**LOCAL: Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti), MUNICIPIO DE VISEU-PA**  
**Contrato: 393/2022/CPL**  
**Valor: R\$ 102.580,60**

**ISS: R\$ 1.538,71 1,50%**

**EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 32.007.827/0001-13**  
**LOCAL: Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti), MUNICIPIO DE VISEU-PA**  
**Contrato: 393/2022/CPL**  
**Valor: R\$ 102.580,60**

**EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 32.007.827/0001-13**  
**LOCAL: Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti), MUNICIPIO DE VISEU-PA**  
**Contrato: 393/2022/CPL**  
**Valor: R\$ 102.580,60**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

O. S. em:	08/12/2022	Identificação da contratada:		Emissão:	04/07/2023	MEDIÇÃO:	02
Prazo:		Modalidade:	TP Nº 021/2022/CPL	Mês:	Junho		
Término:		Contrato nº:	393/2022/CPL	Período:	24/01/2023 a 27/06/2023		
		Assinatura:	21/10/2022	Valor do contrato R\$ 336.880,40			

LOCAL: Localidade de Pitoró (Polo Curupati), MUNICÍPIO DE VISEU-PA  
 OBRA: Construção da E.M.E.F. Pitoró da Ponte, Localidade de Pitoró (Polo Curupati) com 166,17 m², no Município de Viseu/PA  
 EMPRESA: ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 C.E.A.  
 CNPJ: 32.007.827/0001-13

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	

*Simão Pedro Quadros Teixeira*  
**FISCAL DA OBRA**  
**SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA**  
**ENGENHEIRO CIVIL - PMV**  
**CREA-PA 1521489947**





Belém-PA, 21 de julho de 2023.

## SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

À

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VISEU-PA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

Prezados,

A empresa ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, vem solicitar à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VISEU-PA o aditivo de prorrogação de prazo do contrato nº 393/2022/CPL. Referente ao Lote 03: Construção da E.M.E.F. Pitoró da Ponte, Localidade de Pitoró (Polo Curupaiti) com 166,17 M<sup>2</sup>, no município de Viseu/PA. O vencimento do prazo se encerra no dia 19/08/2023. O motivo pelo qual requeremos tal prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com vigência de 19/08/2023 a 15/02/2024, se dá pelo período de chuvas intensas na região, o que ocasionaram atrasos, tanto na chegada de material até o local da obra, quanto na execução dos serviços.

Atenciosamente,

FERNANDO  
AUGUSTO LEITE DA  
SILVA:2638951722  
0

Assinado de forma  
digital por FERNANDO  
AUGUSTO LEITE DA  
SILVA:26389517220

---

FERNANDO AUGUSTO LEITE DA SILVA  
SOCIODIRETOR  
ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ nº 32.007.827/0001-13

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** ACACIO LEITE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.623.382-7**CNPJ:** 32.007.827/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 09:30:00 do dia 05/05/2023**Válida até:** 01/11/2023 ✓**Número da Certidão:** 702023080453877-0**Código de Controle de Autenticidade:** 83765C14.3F64F22A.684A1142.5EEE8784**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.  
SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** ACACIO LEITE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.623.382-7**CNPJ:** 32.007.827/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 09:30:00 do dia 05/05/2023**Válida até:** 01/11/2023 ✓**Número da Certidão:** 702023080453878-9**Código de Controle de Autenticidade:** 6B7ED47D.1902EF2D.5E499013.8151A6B9**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ACACIO LEITE CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 32.007.827/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:56:17 do dia 17/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2023. ✓

Código de controle da certidão: **639B.76F5.1D6C.32F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.007.827/0001-13  
**Razão Social:** ACACIO LEITE CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** - PASSAGEM EUNICE WEAVER 9 SALA 12 - / SACRAMENTA / BELEM / PA / 66083-290

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/07/2023 a 31/07/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023070202570634275108

Informação obtida em 07/07/2023 09:42:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ACACIO LEITE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.007.827/0001-13  
Certidão nº: 11353386/2023  
Expedição: 17/03/2023, às 09:53:54  
Validade: 13/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACACIO LEITE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.007.827/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
 FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM



**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de ACACIO LEITE CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.007.827/0001-13, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 18 maio, 2023

MARCELO SANTOS  
 COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por  
 MARCELO SANTOS  
 COSTA:41001702204  
 Dados: 2023.05.22 09:07:32 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 18/05/2023 11:37:02

CONTROLE: 05181110241583

Válida até 16/08/2023 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.  
 Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 094239/119/2023

Contribuinte: ACACIO LEITE CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 32.007.827/0001-13  
Inscrição Mobiliária: 306864-9  
Inscrição 006/33883/64/10/0289/000/016-49 (ALUGADO)  
Endereço PSS EUNICE WEAVER , 9 SALA 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:18** horas, do dia **28/06/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta ) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 77Q7.XDC1.YORO.OX1F.NREV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : [ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e](http://ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO  
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ACACIO LEITE CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

**INSCRIÇÃO:** 32.007.827/0001-13

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 03/08/2023, às 16:50:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: CCFNL7UN5Q

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.
