



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISEU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatório de Desempenho

TP N°008/2021 – LOTE 04
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF DA
LOCALIDADE DE KM 74 – VILA NAZARÉ – VISEU - PA




Vista da Obra
AGOSTO - 2022

Jefferson Morais
Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PLANO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR - JUSF DA LOCALIDADE DO KM 74 - VILA NUZARÉ (165,11km)
 END: LOCALIDADE DO KM 74 - VILA NUZARÉ, MUNICÍPIO DE VISEU/PA
 CONTRATADA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
 Nº CONTRATO: 384/2021/CP
 VALOR CONTRATO: R\$ 212.818,42
 VALOR ACUMULADO: R\$ 161.520,00
 SALDO CONTRATO: R\$ 31.298,42
 % EXECUTADO: 85,29%
 DATA: 12/08/2022

BOLETIM MEDIÇÃO Nº 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Relatório de Desempenho
AGOSTO - 2022



1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:
 1.1 - POSIÇÃO FÍSICA:

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QNT | PREÇOS | | ACUMULADO ANTERIOR | | MEDIDO NO PERÍODO | | SALDO A EXECUTAR | |
|---|---|------|--------|----------|---------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO | % | FINANCEIRO |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em tons com pedágio de graxa | M2 | 6,00 | 225,48 | R\$ 1.352,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2 | Barrido da madeira (incl. pedágio) | M2 | 12,00 | 860,84 | R\$ 7.930,08 | 100,00% | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | Fixação de placa de madeira em 10mm (incl. 20mm) | M2 | 39,93 | 103,55 | R\$ 7.594,15 | 100,00% | 69,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2 DEMOLIÇÕES E RECONSTRUÇÕES: | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DEMOLUÇÃO DE FERRAÇÃO CERÂMICA DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M | 176,16 | 2,26 | R\$ 415,73 | 100,00% | 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.2 | DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO) DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 161,11 | 20,10 | R\$ 3.334,97 | 100,00% | 161,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.3 | DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES) DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 264,24 | 20,74 | R\$ 5.489,76 | 100,00% | 264,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.4 | REMOÇÃO DE FERRIS DE FERNAL P/C E FERRONERAL DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 159,59 | 1,50 | R\$ 239,37 | 100,00% | 159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.5 | REMOÇÃO DE FERRIS DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 28,56 | 3,29 | R\$ 235,98 | 100,00% | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.6 | REMOÇÃO DE JANELAS DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 12,48 | 23,95 | R\$ 357,28 | 100,00% | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.7 | REMOÇÃO DE TELHES DE FERROIMENTO METALICO E CERÂMICA DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 199,89 | 3,09 | R\$ 614,53 | 100,00% | 199,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.8 | REMOÇÃO DE TRAVA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | M2 | 198,83 | 6,65 | R\$ 1.322,55 | 100,00% | 198,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.9 | REMOÇÃO DE LÓÇAS DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | LN | 11,02 | 10,93 | R\$ 120,23 | 100,00% | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.10 | REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS DE FORNIA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 | LN | 9,00 | 7,96 | R\$ 71,64 | 100,00% | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3 SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | VERGA MOLDAVA EM COQUELO PARA JANELAS COM ATÉ 15 M DE VÃO AF_03/2016 | M | 740 | 96,00 | R\$ 710,40 | 100,00% | 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.2 | VERGA MOLDAVA EM COQUELO PARA ANEIS COM ATÉ 15 M DE VÃO AF_03/2016 | M | 4,00 | 110,72 | R\$ 442,88 | 100,00% | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.3 | CONTRAVERGA MOLDAVA EM COQUELO PARA VÔS DE ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016 | M | 740 | 92,25 | R\$ 683,50 | 100,00% | 740 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.4 | CONTRAVERGA MOLDAVA EM COQUELO PARA VÔS DE ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016 | M | 4,00 | 104,50 | R\$ 418,00 | 100,00% | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4 COBERTURA | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR VAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACINAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 | 198,89 | 84,72 | R\$ 16.729,78 | 100,00% | 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACINAL TIPO PLAN COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M2 | 198,89 | 44,69 | R\$ 8.887,94 | 100,00% | 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4.3 | QUEBRE PARA TELHA CERÂMICA EMBECADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 | M | 38,50 | 26,29 | R\$ 1.012,16 | 100,00% | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4.4 | EMBOCCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO CAL E AREIA) (QUEBRE E BEPALI) AF_12/2019 | M | 57,90 | 26,24 | R\$ 1.516,67 | 100,00% | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5 ESCADARIAS: | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | VIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTUR, SEM CAVALIETE OU MEDIAL PADRÃO POPULAR, BORDADA ESPESURA DE 30CM, TIEM INCLUSOS DOBRADOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE FECHADURA COM ELEGADURO FIURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | LN | 2,00 | 764,95 | R\$ 1.529,92 | 100,00% | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.2 | VIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTUR, SEM CAVALIETE OU MEDIAL PADRÃO POPULAR, BORDADA ESPESURA DE 30CM, TIEM INCLUSOS DOBRADOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEITE FECHADURA COM ELEGADURO FIURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | LN | 13,00 | 803,05 | R\$ 10.439,78 | 100,00% | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.3 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VOROS, BATEITE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAEMBOCCAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | M2 | 0,64 | 512,29 | R\$ 327,64 | 100,00% | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.4 | ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS COM VOROS BATEITE, CONTRAEMBOCCAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | M2 | 5,40 | 316,64 | R\$ 1.726,05 | 100,00% | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.5 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM VOROS PARA VOROS, COM VOROS BATEITE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAEMBOCCAMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | M2 | 6,00 | 392,69 | R\$ 2.116,14 | 100,00% | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 5.6 | PORTA DE ABRIR COM TUBO HORIZONTAL EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESURA DO VIDRO INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF_01/2021 | LN | 1,00 | 4.213,37 | R\$ 4.213,37 | 100,00% | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

fu



| Item | Descrição | UN | Qtd | Valor Unit | Valor Total | % | Valor Unit | Valor Total | % |
|--------------------------|--|----|--------|------------|-----------------------|---------|------------|-----------------------|---------|
| 15.7 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA, 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 8,00 | 95,16 | 761,28 | 0,00% | 0,00 | 761,28 | 0,00% |
| 15.8 | Assento plástico | UN | 3,00 | 41,83 | 125,49 | 0,00% | 0,00 | 125,49 | 0,00% |
| 15.9 | BARRA DE APOIAR EM L, EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 1,00 | 632,08 | 632,08 | 0,00% | 0,00 | 632,08 | 0,00% |
| 15.10 | BARRA DE APOIAR EM L, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 1,00 | 321,10 | 321,10 | 0,00% | 0,00 | 321,10 | 0,00% |
| 15.11 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 | UN | 1,00 | 287,74 | 287,74 | 100,00% | 1,00 | 287,74 | 100,00% |
| 16 | SERVIÇOS FINAIS: | | | | | | | | |
| 16.1 | Placa de inauguração em aço inoxidável br. relevo: (40 x 30cm) | UN | 1,00 | 1.026,33 | 1.026,33 | 0,00% | 0,00 | 1.026,33 | 0,00% |
| 16.2 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 161,48 | 7,82 | 1.262,77 | 0,00% | 0,00 | 1.262,77 | 0,00% |
| TOTAL DO CONTRATO | | | | | R\$ 212.818,42 | | | R\$ 128.220,00 | |

Observações:

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF
 Material e mão de obra para Construção Civil
 CNPJ: 06.788.684/0001-02
 Nº CONTRATO: 304/2021/CPL
 END: LOCALIDADE DO KM 74 - VILA NAZARÉ, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
 CONTRATADA: GC.N. CONSTRUTORA EIRELI

Valor da NF: R\$ 52.300,00

ISS: R\$ 784,60 1,50%

| MEDICÃO | VALOR | % |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1ª MEDICÃO | R\$ 62.000,00 | 28,13% |
| 2ª MEDICÃO | R\$ 67.220,00 | 31,56% |
| 3ª MEDICÃO | R\$ 52.300,00 | 24,57% |
| TOTAL | R\$ 181.520,00 | 86,26% |

FISCAL DA OBRA
 PORTARIA Nº 012/2021 - SEMOB-PMV
 JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA-PA: 151740068-6



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS



| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| CONTRATO | | CONTRATADA | | CNPJ: |
| Nº 384/2021/CPL | | G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI | | 06.789.584/0001-02 |
| OBRA | | | | MEDIÇÃO Nº |
| REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF DO KM 74 - VILA NAZARÉ - VISEU - PA | | | | 3 |
| ART EXECUÇÃO | ART FISCALIZAÇÃO | % EXECUTADO | RS ACUMULADO | PERÍODO |
| | PA20210661839 | 85,29% | RS 181.520,00 | 08/07/2021 - 12/08/2021 |
| OBS: | | | | |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

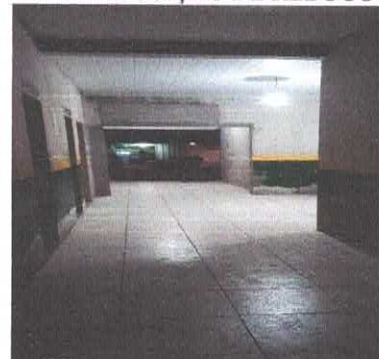

RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



ADEQUAÇÃO DE JANELA



TOTAL DESTA MEDIÇÃO

RS 67.220

| | | |
|---|----------------------------|--|
| ENGENHEIRO / EMITENTE | PREPOSTO / EMITENTE | APROVAÇÃO |
| | | |
| JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS ENGENHEIRO CIVIL/CREA:151740068-6/PA | | CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA |

Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS



| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| CONTRATO | | CONTRATADA | | CNPJ: |
| Nº 384/2021/CPL | | G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI | | 06.789.584/0001-02 |
| OBRA | | | | MEDIÇÃO Nº |
| REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF DO KM 74 – VILA NAZARÉ – VISEU - PA | | | | 3 |
| ART EXECUÇÃO | ART FISCALIZAÇÃO | % EXECUTADO | R\$ ACUMULADO | PERÍODO |
| | PA20210661839 | 85,29% | R\$ 181.520,00 | 08/07/2021 – 12/08/2021 |
| OBS: | | | | |

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO




RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



ADEQUAÇÃO DE JANELA

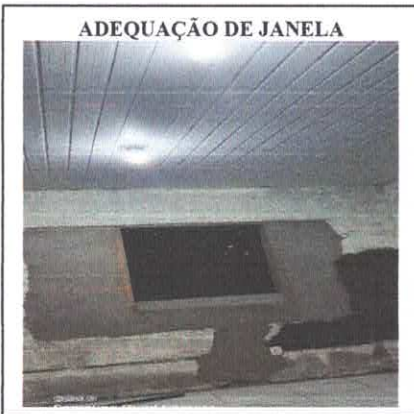

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



TOTAL DESTA MEDIÇÃO

R\$ 52.300,00

| | | |
|--|----------------------------|--|
| ENGENHEIRO / EMITENTE | PREPOSTO / EMITENTE | APROVAÇÃO |
| | | |
| JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS ENGENHEIRO CIVIL/CREA: 151740068-6/PA | | CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA |

Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6
