



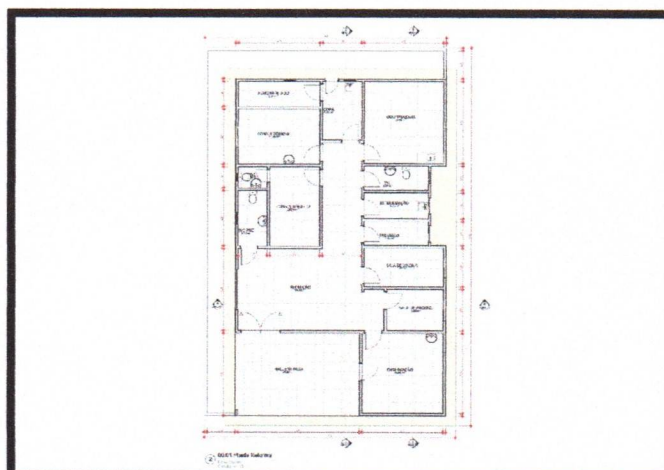

**PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISEU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatório de Desempenho

TP N°008/2021 – LOTE 04
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF DA
LOCALIDADE DE KM 74 – VILA NAZARÉ – VISEU - PA

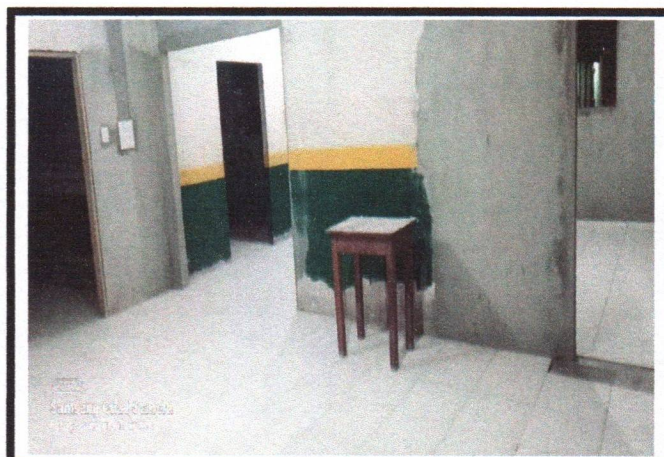

Vista da Obra
NOVEMBRO - 2022

[Handwritten signature]
Jefferson Moreira
Engenheiro Civil
C.R.C. A-151740/2004



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Relatório de Desempenho

NOVEMBRO - 2022



1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:

1.1 - POSIÇÃO FÍSICA:

DATA: 12/08/2022

R\$ 212.814,42

R\$ 181.520,00

R\$ 31.294,42

85,29%

VALOR CONTRATO:

VALOR ACUMULADO:

SALDO CONTRATO:

% EXECUTADO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS
OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF DA LOCALIDADE DO KM 74 - VILA INZARÉ (161,11m²)
END: LOCALIDADE DO KM 74 - VILA INZARÉ, MUNICÍPIO DE VISEU/PA
CONTRATADA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
Nº CONTRATO: 384202/ICPL

CNPJ: 06.789.584/0001-02

TP Nº 008/2021

BOLETIM MEDIÇÃO Nº 03

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QNT	PREÇOS		ACUMULADO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		SALDO A EXECUTAR		
				UNITÁRIO	TOTAL	%	FÍSICO	%	FÍSICO	%	FÍSICO	FINANCEIRO
SERVIÇOS PRELIMINARES:												
1				R\$	16.877,11		R\$	16.877,11		R\$		
1.1	Plano de obra em tinta com pigmento de grafite	M2	6,00	225,48	R\$	1.352,88	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
1.2	Baseado de madeira (incl. instalações)	M2	12,00	660,34	R\$	7.930,08	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
1.3	Taquime e (chapa de madeira) e=10mm (h=20m)	M2	89,96	108,55	R\$	7.594,15	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
DEMOIÇÕES E RETIRADAS:												
2				R\$	12.185,97		R\$	12.185,97		R\$		
2.1	REMOÇÃO DE FLORE DE RODAPÉ CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M	176,16	2,36	R\$	415,73	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.2	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	161,11	20,70	R\$	3.334,97	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.3	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES) DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	264,24	20,70	R\$	5.469,76	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	159,58	1,50	R\$	239,37	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.5	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	28,56	8,26	R\$	235,90	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.6	REMOÇÃO DE ANEIS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	12,48	28,95	R\$	361,29	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.7	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	198,88	3,09	R\$	614,53	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.8	REMOÇÃO DE TRAVA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	198,88	6,65	R\$	1.322,55	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.9	REMOÇÃO DE LOÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	11,00	10,93	R\$	120,23	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
2.10	REMOÇÃO DE METAS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	UN	9,00	7,96	R\$	71,64	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
3	SUPRIMENTOS:			R\$	2.257,63		R\$	2.257,63		R\$		
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS												
3.1												
3.2	VERGA MOLADA N. LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	7,40	96,00	R\$	710,40	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
3.3	VERGA MOLADA N. LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	4,00	110,72	R\$	442,88	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
3.4	CONTRAVERGA MOLADA N. LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	7,40	92,75	R\$	686,35	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
3.5	CONTRAVERGA MOLADA N. LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	4,00	104,50	R\$	418,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
4	COBERTURA:			R\$	28.146,55		R\$	28.146,55		R\$		
4.1	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR REPAR. CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	198,88	84,12	R\$	16.729,76	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	198,88	44,69	R\$	8.887,94	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
4.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO CAL E AREIA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	38,50	26,29	R\$	1.012,16	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
4.4	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO CAL E AREIA - (CUMEEIRA E BERRAL) AF 12/2019	M	57,80	26,24	R\$	1.516,67	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5	ESQUADRIAS:			R\$	20.379,10		R\$	20.379,10		R\$		
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEITE OU MEDIAN) PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORÇADIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	2,00	768,96	R\$	1.537,92	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEITE OU MEDIAN) PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DORÇADIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	13,00	803,06	R\$	10.439,78	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VÍDROS BATE-TE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	0,64	512,26	R\$	327,84	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5.4	JANELA DE ALUMÍNIO COM VÍDROS BATE-TE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	5,40	319,64	R\$	1.728,05	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO COM VÍDROS BATE-TE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E INSTALAÇÃO AF 12/2019	M2	6,00	352,69	R\$	2.116,14	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$
5.6	PORTA DE ABRI COM MOLA HIDRÁULICA EM VÍDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DO 19MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS AF 07/2021	UN	1,00	4.231,37	R\$	4.231,37	100,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$



 Página 3 de 6



15.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVA DE 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	8,00	R\$ 95,16	R\$ 761,28	0,00%	0,00	R\$ 761,28	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	8,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -
15.8	Assento plástico	UN	3,00	R\$ 41,83	R\$ 125,49	0,00%	0,00	R\$ 125,49	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	3,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -
15.9	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 632,08	R\$ 632,08	0,00%	0,00	R\$ 632,08	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	1,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -
15.10	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 321,10	R\$ 321,10	0,00%	0,00	R\$ 321,10	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	1,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -
15.11	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 287,74	R\$ 287,74	100,00%	1,00	R\$ 287,74	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	1,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -
16	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 2.289,10			R\$ -						R\$ -			R\$ 2.289,10
16.1	Piça de inauguração em apo inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	UN	1,00	R\$ 1.026,33	R\$ 1.026,33	0,00%	0,00	R\$ 1.026,33	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 1.026,33
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	M2	161,48	R\$ 7,82	R\$ 1.262,77	0,00%	0,00	R\$ 1.262,77	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 1.262,77
TOTAL DO CONTRATO				R\$ 212.818,42				R\$ 212.818,42						R\$ 52.300,00			R\$ 31.298,42
Observações:																	
RESUMO DA OBRA																	
DADOS OBRIGATORIOS NA NF																	
Material e mão de obra para Construção Civil																	
CNPJ: 06.789.894/0001-42																	
Nº CONTRATO: 384/2021/CPL																	
END: LOCALIDADE DO KM 74 - VILA NAZARÉ, MUNICÍPIO DE VISEU-PA																	
CONTRATADA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI																	
Valor da NF: R\$ 52.300,00																	
ISS: R\$ 784,50 1,50%																	
HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES																	
MEDIÇÃO			VALOR		%												
1ª MEDIÇÃO			R\$ 62.000,00		29,13%												
2ª MEDIÇÃO			R\$ 67.220,00		31,59%												
3ª MEDIÇÃO			R\$ 52.300,00		24,57%												
TOTAL			R\$ 181.520,00		86,29%												

FISCAL DA OBRA
PORTARIA Nº 012/2021 - SEMOB-PMV
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151740068-6




MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ:
Nº 384/2021/CPL	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	06.789.584/0001-02
OBRA		MEDIÇÃO Nº
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF DO KM 74 – VILA NAZARÉ – VISEU - PA		3
ART EXECUÇÃO	ART FISCALIZAÇÃO	% EXECUTADO
	PA20210661839	85,29%
		R\$ ACUMULADO
		R\$ 181.520,00
		PERÍODO
		08/07/2021 – 01/11/2022
OBS:		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

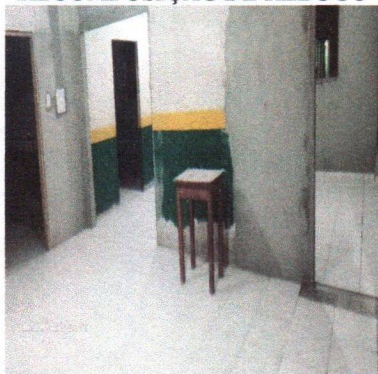

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO




RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

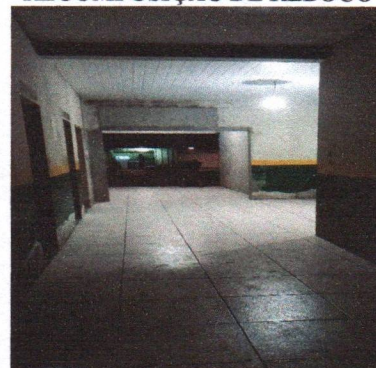


RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

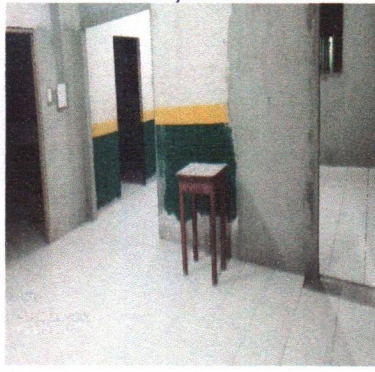

ADEQUAÇÃO DE JANELA

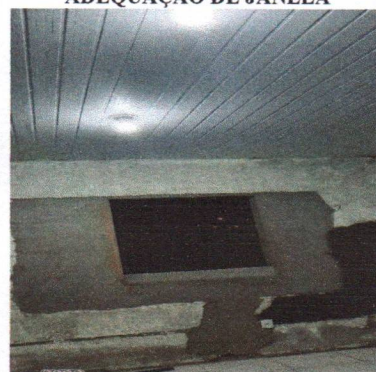

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

R\$ 52.300,00

ENGENHEIRO / EMITENTE	PREPOSTO / EMITENTE	APROVAÇÃO
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS ENGENHEIRO CIVIL/CREA:151740068-6/PA		CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS


CONTRATO	CONTRATADA	CNPJ:
Nº 384/2021/CPL	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	06.789.584/0001-02
OBRA	MEDIÇÃO Nº	
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF DO KM 74 – VILA NAZARÉ – VISEU - PA	3	
ART EXECUÇÃO	ART FISCALIZAÇÃO	PERÍODO
	PA20210661839	08/07/2021 – 01/11/2022
% EXECUTADO		
85,29%		
R\$ ACUMULADO		
R\$ 181.520,00		
OBS:		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

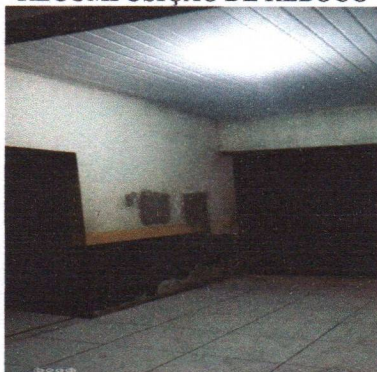

RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

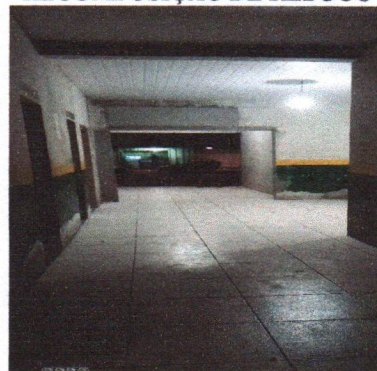


ADEQUAÇÃO DE JANELA



ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO



RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO

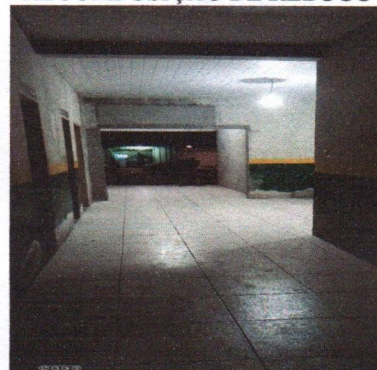

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

R\$ 52.300,00

ENGENHEIRO / EMITENTE	PREPOSTO / EMITENTE	APROVAÇÃO
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS ENGENHEIRO CIVIL/CREA:151740068-6/PA		CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA
