



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 918/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 27 de maio de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO** da EMEI RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA, NA LOCALIDADE MARIANA, no Município de Viseu, contrato nº 513/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 13/2021.

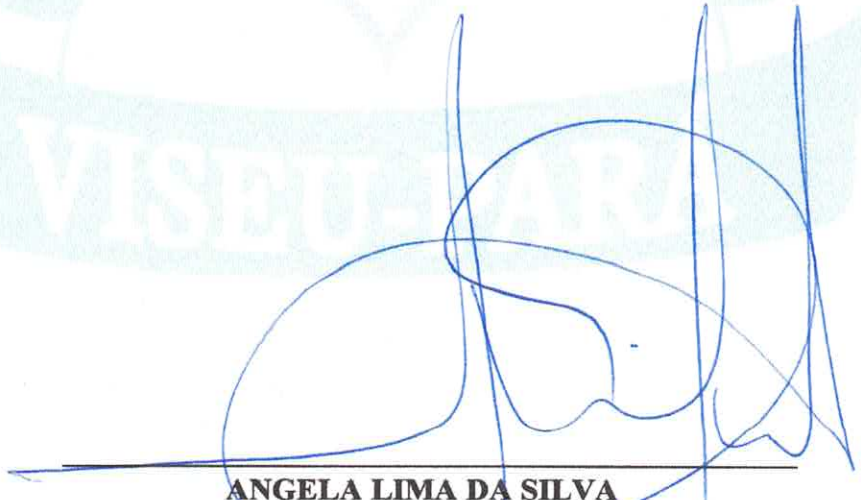
A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/06/2022 a 18/12/2022. E assim sendo, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de 86,84%, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 329/2022 - SEMOB
- Justificativa Técnica

Atenciosamente,


ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019



Belém-PA, 19 de Maio de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Obras

Projeter Edificação e Pavimentação Eirele-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.506.432.0001/49, com sede na Av. Bernardo Sayão, 2050, Jurunas, Belém, Pará, telefone (91) 98577 1175, por seu representante legal infra assinado, por meio deste, **SOLICITO o 1º ADITIVO DE PRAZO DA** Reforma e ampliação da E.M.E.I. Raimunda Silva Oliveira – Mariana, **no Município de Viseu/Pá**, Contrato nº 513/2021/CPL, que se refere a **TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021**. Esta empresa **NÃO APRESENTA ÓBICE** ao termo do aditivo.

Justificando-se devido primeiramente devido ao **forte inverno amazônico, e o fato de não conseguirmos colocar material na obra.**

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **21/06/2022 a 18/12/2022**.

Obra está com 86,84% de execução.

PROJETAR EDIFICACAO
E PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149

Assinado de forma digital
por PROJETER EDIFICACAO E
PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149
Dados: 2022.05.19 12:13:17
-03'00'



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

Ofício N.º 329 / 2022 / SEMOB

Viseu, 27 de maio de 2022



Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 013/2021.

Por meio deste, solicitamos à V.S.ª para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA - MARIANA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N° 513/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 013/2021**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **21/06/2022** a **18/12/2022**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **86,84 %**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:004337882
08

Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO
PINTO CORREA:00433788208
Dados: 2022.05.27 12:03:44
-03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil
Decreto n° 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

SECRETARIA DE OBRAS
RECEBIDO
EM 27/05/22
ÀS 12:31h
ESP: [Assinatura]
