



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 1936/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 25 de novembro de 2022.

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA**

Vossa Senhoria

**NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO**

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS**, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação – SEMED/PMV, no Município de Viseu, contrato nº 058/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022.

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 04/12/2022 a 02/06/2023, que atualmente a obra se encontra com 60% de avanço físico – financeiro, conforme a justificativa técnica da engenheira. Desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 108/2022 – SEMOB.
- Solicitação Análise Técnica
- Justificativa Técnica.
- Certidões da Empresa.
- Relatório de Desempenho.
- Relatório fotográfico.

Atenciosamente,

**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 04/2022



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

SEMED  
SETOR DE PROTOCOLO  
**RECEBIDO**  
EM 24/11/22  
ÀS 10:56h  
RESP: *Heleucl*

Ofício N.º 108/ 2022 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 23 de novembro de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**  
Ângela Lima da Silva



**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEMED/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 005/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.<sup>a</sup> para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEMED/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo Nº 058/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **04/12/2022** a **02/06/2023**, que atualmente a obra se encontra com 60% de avanço físico – financeiro. Conforme a justificativa técnica da engenharia em anexo.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Ofício Nº 1924/2022/GS/SEMED/PMV – SOLICITANDO ANÁLISE TÉCNICA;
- Pedido de Prorrogação de Prazo da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Relatório de Desempenho;
- Relatório Fotográfico e
- Certidões da Empresa.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO  
PINTO  
CORREA:00433788208  
Assinado de forma digital por  
CARLOS AUGUSTO PINTO  
CORREA:00433788208  
Dados: 2022.11.23 18:25:35 -03'00'

**Carlos Augusto Pinto Corrêa**  
Secretário de Obras/Engenheiro Civil  
Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2  
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - CNPJ: 04.873.618/0001-17  
Rua Nova com Travessa Tiradentes, S/Nº, Centro – Viseu – Pará  
[semobr@viseu.pa.gov.br](mailto:semobr@viseu.pa.gov.br)





## PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA**

**ASSUNTO: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**REFERÊNCIA: CONTRATO N° 058/2022/CPL - TOMADA DE PREÇO 005/2022**

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste, apresentar pedido de prorrogação do prazo de vigência ao referido no CONTRATO N° 058/2022/CPL - TOMADA DE PREÇO 005/2022, firmado entre a **Prefeitura Municipal de Viséu** e a Empresa **WD COMERCIO E SERVICO EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ N° 31.481.043/0001-60, que tem por objeto a perfuração de 10 (dez) poços semi artesianos de 30 (trinta) metros, para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED/PMV, conforme TP 005/2022, Contrato n° 058/2022/CPL, no município de Viséu /PA, conforme justificativa a seguir exposta:

### DA JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada, **WD COMERCIO E SERVICO EIRELI**, apresentou atrasos na referida obra, devido o aumento dos índices pluviométricos na região, extrapolando dessa maneira o prazo inicialmente estipulado para conclusão da obra.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante para encerramento do contrato não será suficiente para a conclusão dessa obra, que possui significativa importância para o Município, servimo-nos do presente para justificar e solicitar a prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitação.

O presente pedido de prorrogação de prazo acresce ao prazo original do objeto contratual em 180 (cento e oitenta) dias, sendo de 04 de dezembro de 2022 a 02 de junho de 2023, gerando um novo cronograma físico – financeiro.

Belém, 16 de novembro de 2022.

WD COMERCIO E  
SERVICO  
LTDA:31481043000  
160

Assinado de forma  
digital por WD  
COMERCIO E SERVICO  
LTDA:31481043000160

---

**W D COMERCIO E SERVICO EIRELI**  
CNPJ N° 31.481.043/0001-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 1924/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 23 de novembro de 2022.

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Vossa Senhoria

**CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA**

Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUN. DE OBRAS / PMV

RECEBIDO ÀS \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ h

Em: 23 / 11 / 2022

Assinatura / Visto

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa WD COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, em anexo, para Análise Técnica referente 1º **ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 058/2022/CPL, Tomada de Preço nº 05/2022, que tem por objetivo a perfuração de 10 (dez) poços semi artesianos de 30 (trinta) metros, no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

**ANGELA LIMA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
DECRETO Nº 04/2022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



## JUSTIFICATIVA TÉCNICA

**Assunto:** ADITIVO DE PRAZO

**Contrato:** Nº 058/2022/CPL – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022

**Contratada:** WD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ:** 31.481.043/0001-60


**Objeto:** PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: Nº 058/2022/CPL** que provocaram o atraso na execução das obras e serviços de **PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois devido as chuvas decorrentes do período do inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na mobilização de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Em consonância com o disposto no parágrafo anterior temos o **DECRETO Nº 011/2022 DE 30 DE ABRIL DE 2022 – GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU, ESTADO DO PARÁ**, que elucida as situações pautadas.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU – FUNDEB** para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com avanço físico de **60,00%**.

Assim apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

  
Jefferson Moraes  
Engenheiro CIVIL  
C.R.C. - A- 15174036-3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



- a) Em consulta à contratada, esta manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor;
- b) A continuidade na execução do objeto já contratado minimiza custos e tempo, já que seria mais oneroso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;
- c) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- d) Os serviços vêm sendo prestados de modo regular e tem produzido os efeitos desejados, tendo em vista que os profissionais são habilitados e tem vasta experiência na área;
- e) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § I, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento (**04/12/2022 a 02/06/2023**) do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 22 de novembro de 2022.

  
JEFFERSON MORAIS  
Engenheiro CIVIL  
CREA-PA: 151740068-6

---

**Jefferson Clayton Xavier Morais**  
**Engenheiro Civil – PMV**  
**CREA-PA: 151740068-6**




**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE VISEU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



**Relatório de Desempenho**

**TP Nº005/2022**

**PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30  
(TRINTA) METROS, DEMANDA DA SEMED/PMV.**

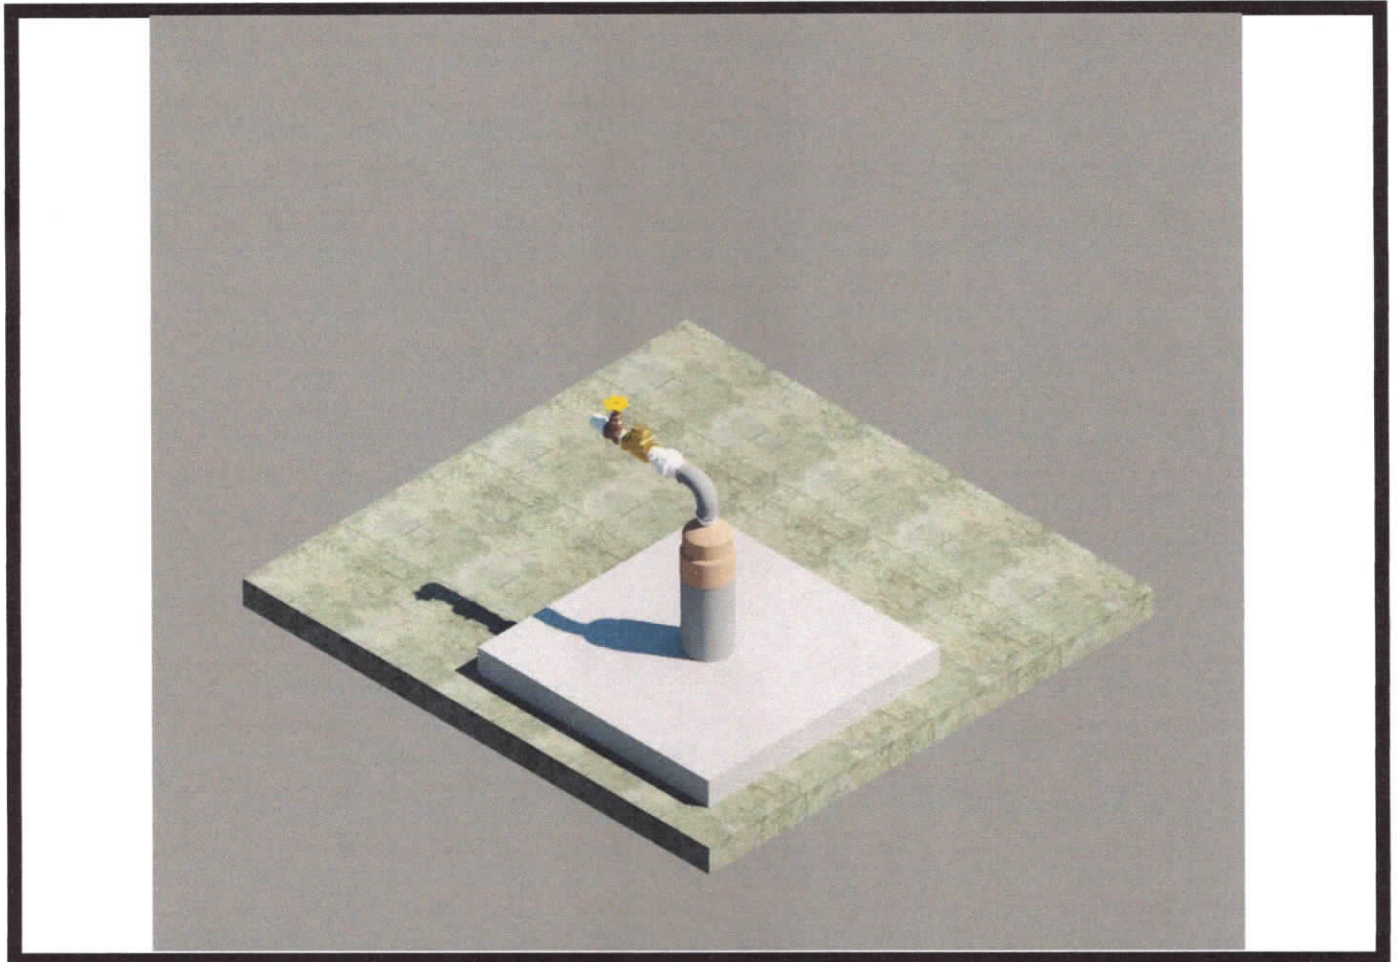

Vista da Obra

NOBEMBRO - 2022

  
Jefferson Moraes  
Engenheiro CIVIL  
C.R.C. 32.174/2022-91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### Relatório de Desempenho



Abril - 2022

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:

1.1 - POSIÇÃO FÍSICA:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS   |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO |        |                    |             | Identificação da contabilidade: |            | Emissão:        |           | MÊS:                   |             | MEDIÇÃO:                |           |        |
|---|--|--------------------|--------|--------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|--------|
|   |  | O.S. em:           |        | Prazo:             |             | Mês:                            |            | Período:        |           | Novembro               |             | 06                      |           |        |
|   |  | Modicidade:        |        | Contrato n.º:      |             | Valor do contrato:              |            | R\$ 245.700,74  |           | 04/11/2022             |             | 04/11/2022 à 04/11/2022 |           |        |
|   |  | OBRÁ:              |        | Assinatura:        |             | R\$ 245.700,74                  |            | 06/20/2022      |           | 04/11/2022             |             | 06                      |           |        |
|   |  | EMPRESA:           |        | CNPJ:              |             | R\$ 245.700,74                  |            | 04/11/2022      |           | 04/11/2022             |             | 06                      |           |        |
|   |  | CNPJ:              |        | R\$ 245.700,74     |             | R\$ 245.700,74                  |            | 04/11/2022      |           | 04/11/2022             |             | 06                      |           |        |
| ITEM  | SERVIÇOS   | CONTRATO           |        | ACUMULADO ANTERIOR |             | EXECUÇÃO DO PERÍODO             |            | ACUMULADO TOTAL |           | SALDO                  |             | FÍSICO                  | FINANC.   |        |
|   |  | UNID.              | QUANT. | UNITÁRIO (R\$)     | TOTAL (R\$) | QUANT.                          | %          | TOTAL (R\$)     | QUANT.    | %                      | TOTAL (R\$) |                         |           | FÍSICO |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES:                               |                    |        | R\$                | 5.811,04    | R\$                             | 2.800,92   | R\$             | 535,18    | R\$                    | 3.277,10    | R\$                     | 2.144,74  |        |
| 1.1   | Poses de obra em terra com pedregulho e grutas       | M                  | 12     | 24,00              | 228,41      | R\$                             | 2.800,92   | R\$             | 535,18    | 44,8                   | 80,00%      | R\$                     | 2.144,74  |        |
| 2   | PERFORAÇÃO DE POÇO                                   |                    |        | R\$                | 265.447,00  | R\$                             | 102.723,50 | R\$             | 20.944,70 | R\$                    | 122.282,20  | R\$                     | 82.770,00 |        |
| 2.1   | Poço Tântor 4" - 100x50m                             | UN                 | 01,00  | 265.447,00         | R\$         | 102.723,50                      | R\$        | 20.944,70       | 8,0       | 80,00%                 | R\$         | 122.282,20              | 4,0       | 80,00% |
| 3   | CAPTAÇÃO DE ÁGUA:                                    |                    |        | R\$                | 34.000,00   | R\$                             | 17.448,95  | R\$             | 3.489,95  | R\$                    | 20.939,94   | R\$                     | 13.850,00 |        |
| 3.1   | Bomba Solenóides 1CV (sem instalação)                | UN                 | 01,00  | 18.999,99          | R\$         | 8.484,95                        | R\$        | 1.899,99        | 5,0       | 80,00%                 | R\$         | 10.193,94               | 4,0       | 80,00% |
| 3.2   | TUBO PVC RIGÍD. Ø=112 (50mm)                         | M                  | 240,00 | 4,83               | 1.159,20    | R\$                             | 5.255,90   | R\$             | 1.947,12  | 14,0                   | 80,00%      | R\$                     | 5.282,72  |        |
| 3.3   | União de varca de aço galvanizado dim=112            | UN                 | 60,00  | 69,00              | 4.140,00    | R\$                             | 2.070,00   | R\$             | 414,00    | 5,0                    | 80,00%      | R\$                     | 2.484,00  |        |
| 3.4   | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COVERT D=112mm (1/2") | UN                 | 01,00  | 180,00             | 180,00      | R\$                             | 960,00     | R\$             | 190,00    | 5,0                    | 80,00%      | R\$                     | 1.180,00  |        |
| 3.5   | RESISTOR DE GWETA SINTÉTICO Ø=112mm (1/2")           | UN                 | 01,00  | 100,00             | 100,00      | R\$                             | 540,15     | R\$             | 100,00    | 5,0                    | 80,00%      | R\$                     | 640,15    |        |
| 3.6   | Correia Ø2" longa em perç. adiant. (dim=50mm)        | UN                 | 01,00  | 23,85              | 23,85       | R\$                             | 119,25     | R\$             | 23,85     | 5,0                    | 80,00%      | R\$                     | 143,10    |        |
|   |  |                    |        | R\$                | 243.000,00  | R\$                             | 122.854,35 | R\$             | 24.570,87 | R\$                    | 147.425,22  | R\$                     | 98.268,22 |        |
| Observações:  |  |                    |        |                    |             |                                 |            |                 |           |                        |             |                         |           |        |
| RESUMO DA OBRA  |  | RESUMO CONTRATO    |        |                    |             | MEDIÇÃO                         |            |                 |           | HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES |             |                         |           |        |
| EMPRESA: VFO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ERELI<br>CNPJ: 31.461.040/0001-60<br>LOCAL: EM.EF. RUI DE OLIVEIRA ALVES, PIMENTA, MUNICÍPIO DE VISEU-PA<br>Contrato n.º: 159/2022CPL<br>Valor da NF: R\$ 245.700,74 |  | VALOR CONTRATO:    |        | R\$ 245.700,74     |             | MEDIÇÃO                         |            | VALOR           |           | %                      |             |                         |           |        |
|   |  | VALOR ACUMULADO:   |        | R\$ 147.425,22     |             | 1ª MEDIÇÃO                      |            | R\$ 24.570,87   |           | 10,00%                 |             |                         |           |        |
|   |  | SALDO CONTRATO:    |        | R\$ 98.268,52      |             | VALOR NOTA FISCAL               |            | R\$ 24.570,87   |           | 10,00%                 |             |                         |           |        |
|   |  | % EXECUTADO:       |        | 60,00%             |             | R\$ 24.570,87                   |            | R\$ 24.570,87   |           | 10,00%                 |             |                         |           |        |
|   |  |                    |        | R\$ 243.000,00     |             | R\$ 122.854,35                  |            | R\$ 24.570,87   |           | R\$ 147.425,22         |             | R\$ 98.268,22           |           |        |
|   |  |                    |        |                    |             |                                 |            | TOTAL           |           | R\$ 147.425,22         |             | 60,00%                  |           |        |





# MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

|   |                         |                               |                     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>CONTRATO</b>   |                         | <b>CONTRATADA</b>             |                     | <b>CNPJ:</b>            |
| Nº 058/2022/CPL   |                         | WD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |                     | 31.481.043/0001-60      |
| <b>OBRA</b>   |                         |                               |                     | <b>MEDIÇÃO Nº</b>       |
| PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS DE 30 (TRINTA) METROS, DEMANDA DA SEMED/PMV, VISEU-PA. |                         |                               |                     | 6                       |
| <b>ART EXECUÇÃO</b>   | <b>ART FISCALIZAÇÃO</b> | <b>% EXECUTADO</b>            | <b>RS ACUMULADO</b> | <b>PERÍODO</b>          |
|   | PA20210690163           | 60.00%                        | R\$ 147.425,22      | 03/10/2022 – 03/11/2022 |

OBS:

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PERFURAÇÃO DE POÇO



PERFURAÇÃO DE POÇO



PERFURAÇÃO DE POÇO



PERFURAÇÃO DE POÇO

**TOTAL DESTA MEDIÇÃO** R\$ 24.570,87

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>ENGENHEIRO / EMITENTE</b>   | <b>PREPOSTO / EMITENTE</b> | <b>APROVAÇÃO</b>   |
|  |                            |  |
| JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS<br>ENGENHEIRO CIVIL/CREA: 151740068-6/PA |                            | CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS<br>ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA |

Jefferson Moraes  
Engenheiro Civil  
CREA: 151740068-6

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WD COMERCIO E SERVICO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.616.360-8**CNPJ:** 31.481.043/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 14:17:43 do dia 08/11/2022**Válida até:** 07/05/2023**Número da Certidão:** 702022081041285-9**Código de Controle de Autenticidade:** 230C9FAB.E9620F4F.0DB8DE9E.9EE044C5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** WD COMERCIO E SERVICO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.616.360-8**CNPJ:** 31.481.043/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 14:17:43 do dia 08/11/2022**Válida até:** 07/05/2023**Número da Certidão:** 702022081041286-7**Código de Controle de Autenticidade:** EC6512A8.A0A73085.FB19C6A6.884BF5C7**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **WD COMERCIO E SERVICO LTDA**  
CNPJ: **31.481.043/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:25:50 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/01/2023.

Código de controle da certidão: **594C.BD67.1FBB.3A24**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110885/119/2022

Contribuinte: WD COMERCIO E SERVICO LTDA  
CPF/CNPJ: 31.481.043/0001-60  
Inscri o Mobili ria: 304333-8  
Inscri o 015/34883/53/74/0352/000/000-85 (ALUGADO)  
Endere o TV QUINTINO BOCAIUVA , 1962 LETRA A

Inscri o( es) D. Ativa de Cr dito(s) N o Tribut rio(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer d vidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada,   certificado que: N o constam d bitos em seu nome, relativos a tributos ou cr ditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finan as.

Certid o emitida  s **08:43** horas, do dia **31/08/2022** com fulcro na instru o Normativa n  06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta ) dia(s)**

C digo de Controle de Certid o : BFIE.6OH1.NP0L.HDEA.IZIG

Aten o : Qualquer emenda ou rasura invalidar  este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : [ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e](http://ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.481.043/0001-60

**Razão Social:**WD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**Endereço:** TV TV QUINTINO BOCAIUVA 1962 LETRA A / NAZARE / BELEM / PA /  
66035-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**08/11/2022 a 07/12/2022

**Certificação Número:** 2022110804525384483008

Informação obtida em 08/11/2022 14:23:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WD COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 31.481.043/0001-60  
Certidão n°: 38900534/2022  
Expedição: 08/11/2022, às 14:25:28  
Validade: 07/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WD COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.481.043/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.
